

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»
στα πλαίσια της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 8/12/2014, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι υπογράφοντας την παρούσα σύμβαση:


1. η **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ (ΑΦΜ: 997687965, ΔΟΥ: Κομοτηνής)** που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη στην οδό Καραολή & Δημητρίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, κ. Δημήτριο Πέτροβιτς, δυνάμει της αριθμ.5320/22-9-2014 απόφασης Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης (ΦΕΚ 2728/ Β/ 13-10-2014), **ενεργώντας για λογαριασμό του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, και**
2. η **εταιρεία TETRAGON LTD – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ (ΑΦΜ: 082338867 – ΔΟΥ: ΣΤ'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)** που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Καραϊσκάκη 2Β ΤΚ 54641 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωαννίδη Παναγιώτη, κάτοχο του Α.Δ.Τ.: ΑΕ186153,

για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» και έχοντας υπόψη:

- Την από 27/12/2013 αρχική σύμβαση (με ΑΔΑ:ΒΛΓΥ7ΛΒ-ΞΒΘ και ΑΔΑΜ: 13ΣΥΜΝ001810609) η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, διάρκειας 140 ημερών, ήτοι από 27/12/2013 έως 16/5/2014.
- Την από 2/6/2014 παράταση σύμβασης (με ΑΔΑ: ΒΙΥΚ7ΛΒ-ΜΕΚ και ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002081736) για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» στα πλαίσια της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» - ΤΜΗΜΑ 1: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
- Το από 3/10/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού σχετικά με την ανάγκη χορήγησης τρίτης παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του Υποέργου [2] «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
- Την αριθμ. 6283/9-10-2014 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Α.Μ.Θ. περί εγκρίσεως της εκ νέου παράτασης μέχρι τις 15/1/2015.
- Την αριθ. 826/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εκ νέου παράταση του υποέργου [2] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» μέχρι τις 15/1/2015.
- Την υποβολή νέου χρονοδιαγράμματος από τον δεύτερο συμβαλλόμενο

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την τροποποίηση της από 27/12/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΒ-ΞΒΘ) σύμβασης για το Υποέργο [2] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» αναφορικά με την χρονική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του υποέργου και την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης.

Οι εργασίες του υποέργου [2] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 15/1/2015. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις Συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με το παρακάτω νέο προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα:

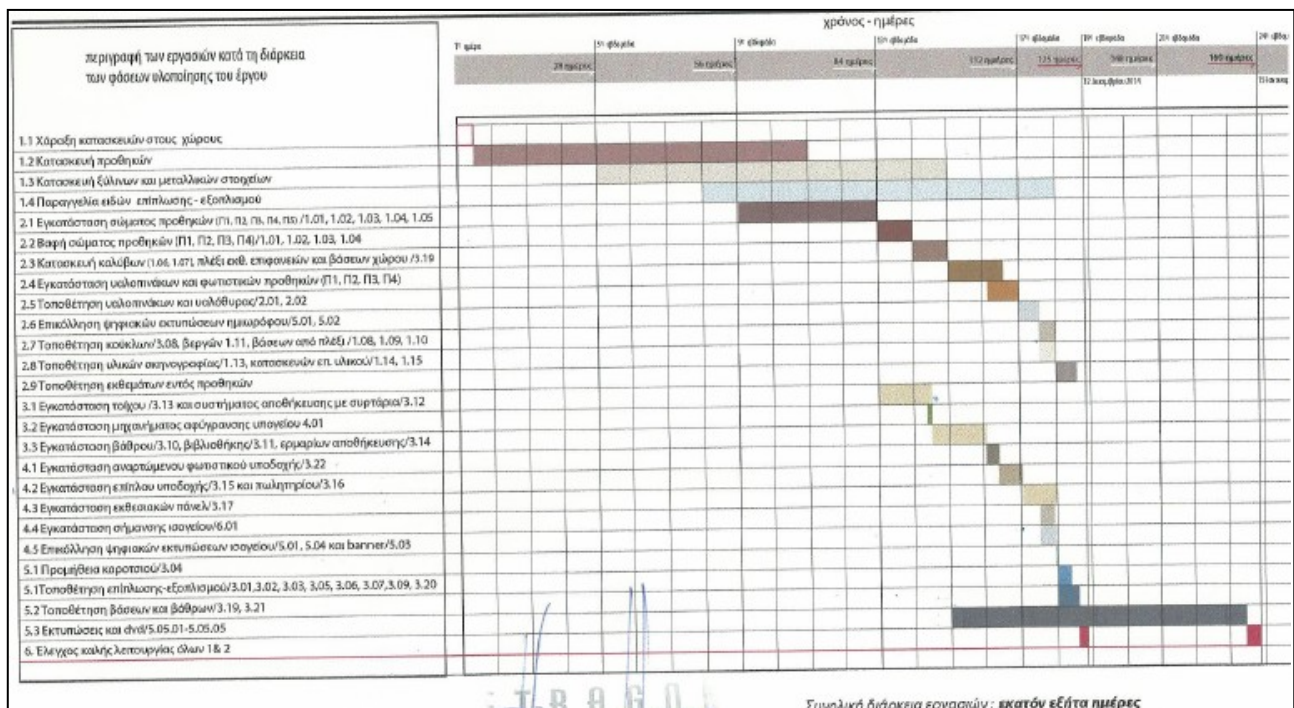

Η ημερομηνία ισχύς της από 27/12/2013 σύμβασης παρατείνεται μέχρι τις 15/1/2015. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συμφωνιών, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται η παρούσα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) Αντίτυπα, από τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τέσσερα και ο Ανάδοχος έλαβε ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Π.Α.Μ.Θ. ΠΕ΄Εβρου
Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου,

Για την TETRAGON LTD

Δημήτριος Πέτροβιτς

Ιωαννίδης Παναγιώτης
